

緊急修繕報告書

受付番号 **321**






施工担当者 (有) **伊勢崎設備**

現場住所	波志江町 1234 番 4	×× ×× 先	従業員数 4	(複数日は延べ数)
修繕日時 (現場従事時間)	5 月 25 日 10 時 00 分 から 5 月 25 日 16 時 00 分			
修繕内容 (調査内容)	φ40×φ25チーズ部の漏水修繕。 水道局の指示によりφ25止水栓を新設した。		外注交通誘導員数 (警備日報添付)	1人

水替ポンプ ○なし ●担当者分 ○他者分	工用電源 ○なし ●担当者分 ○他者分	断水方法(複数記入可) <input type="checkbox"/> なし・吐水 <input checked="" type="checkbox"/> 圧着 <input checked="" type="checkbox"/> 弁栓閉め <input type="checkbox"/> エアバッグ外特殊工法
-------------------------	------------------------	---

土工事の内容 ○土工事なし ○掘削のみ ○埋戻のみ ●掘削埋戻し	土工事機械の持ち出し ○なし ●担当者分 ○他者分	油圧ショベルの使用 ○なし ●有り
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

施工担当者の購入材料			
SK-Xソケットφ40	2 ケ	防食ポリエチレンフィルム(小)	1 枚
MCスーパーユニオンソケットφ40	1 ケ	鋳鉄製止水栓筐・承板	1 組
HIビニール管φ40	0.9 m		
ボール式止水栓φ25	1 ケ		
HIシモク・ガイドナットφ25	2 ケ		
HIビニール管φ25	0.3 m		
HIソケットφ25	2 ケ		

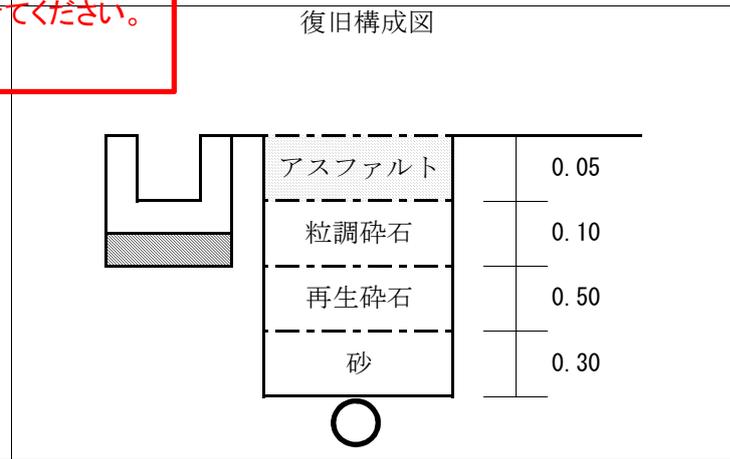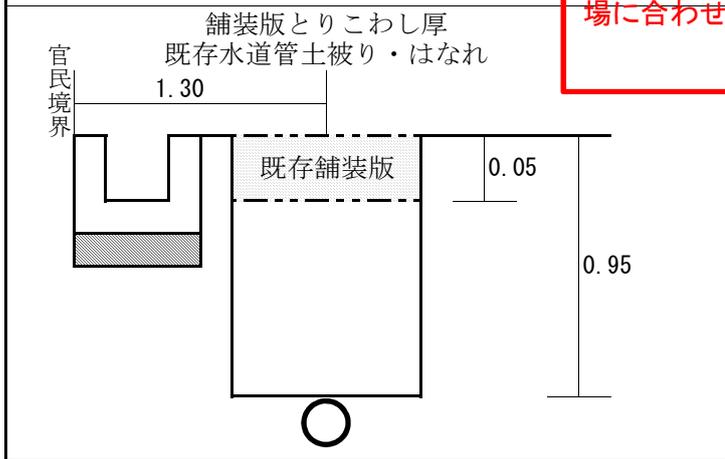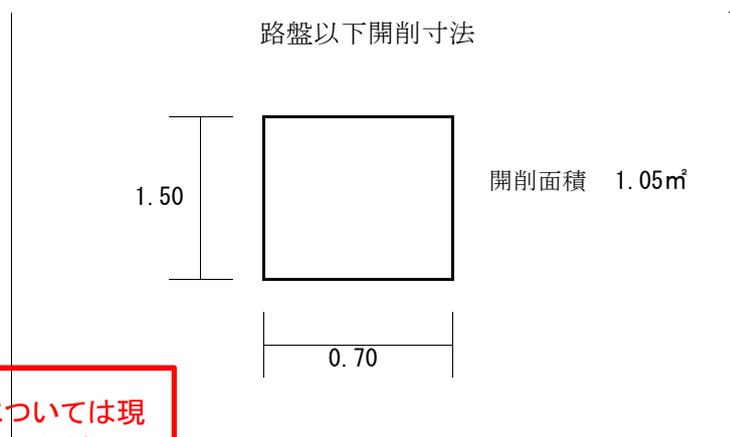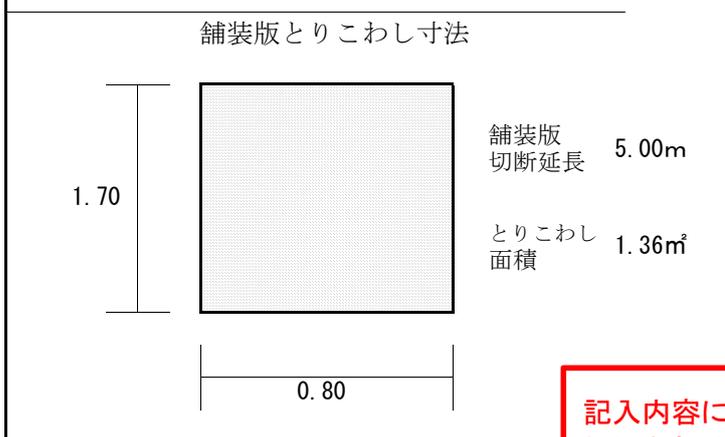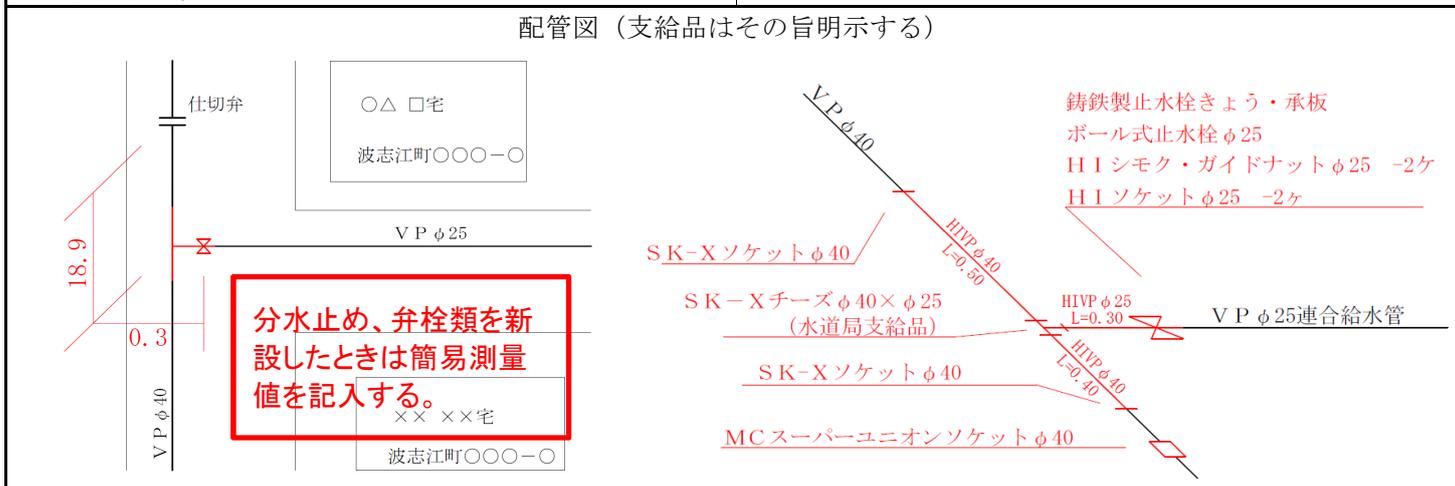

記入内容については現場に合わせてください。
